					4,260,398,723	1,292,403,926							
Nr	Programi	Qarku	Bashkia	Emertimi I objektit	Vlera e investimit leke me TVSH	Vlera e Likuiduar	Data e fillimit te punimeve	**Data e perfundimit te punimeve**	Financuesi I Investimit	Kontraktuesi	Statusi I punimeve	% e realizimit faktik te punimeve
1	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Sarande	EKO Kampus Saranda	330,577,453	123,174,678	tetor 2015	**Jun-17**	FZHR	JV	proces zbatimi	**40%**
2	Infrastruktura	Qarku Berat	Bashkia Ura Vajgur	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Andrea Mbrice, Poshnje, B. Ura Vajgurore	52,710,346	37,220,216	29.8.2016	**Dec-16**	FZHR	Firma "4A-M" shpk	perfunduar	**100%**
3	Infrastruktura	Qarku Diber	Bashkia Bulqize	Rikonstruksion i shkollave te njesise administrative Shupenze, bashkia Bulqize	86,808,744	58,585,447	14.9.2016	**Mar-17**	FZHR	Firma "Ndregjoni I" shpk	perfunduar	**100%**
4	Infrastruktura	Qarku Durres	Bashkia Durrës	Ndertim I shkolles 9-vjecare "Marie Kaculini", Durres	103,318,260	0	dhjetor 2016	**dhjetor 2017**	FZHR	Firma "Murati&Boshniaku&"	ka kontrate por nuk ka leje ndertimi	**0%**
5	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Elbasan	Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare "Qamil Guranjaku"	65,448,856	65,448,856	29.7.2016	**Oct-16**	FZHR	Firma "Ergi" shpk	perfunduar	**100%**
6	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Cerrik	Ndertimi i shkolles, ndertimi i palestres, terrenet sportive dhe sistmimi i territorit te shkolles 9-vjecare Adem Elmas Asllani" shtepanje, piesia gostime, cerik	72,948,120	36,000,000	30.10.2016	**90 dite**	FZHR	Firma "Ergi" shpk	perfunduar	**100%**
7	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Fier	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Dino Ismaili", Levan, Bashkia Fier	24,133,740	4,596,816		**Mars 2017**	FZHR	Firma "Aluera&Ari	perfunduar	**100%**
8	Infrastruktura	Qarku Gjirokaster	Bashkia Memaliaj	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Nimete Progonati", Bashkia Memaliaj	55,781,695	17,527,644	Gusht 2016	**Feb-17**	FZHR	Firma "Boshnjaku B" shpk	perfunduar	**100%**
9	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Korce	Ndertim shkolle e re ne fshatin Kamenice	25,197,822	19,999,980	Shtator 2016	**Mars 2017**	FZHR		perfunduar	**100%**
10	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion i objektit dhe terreneve sportive te shkolles 9-vjecare "Kozma Gjoke Basho"	85,979,400	42,475,125	14.9.2016	**Mar-17**	FZHR		proces zbatimi	**75%**
11	Infrastruktura	Qarku Shkoder	Bashkia Vau i Dejes	Ndertim i shkolles 9-vjecare "Don Martin Trushi" Stajke, Komuna Bushat	71,404,288	61,066,308	11.8.2016	**Apr-17**	FZHR	Firma "Junik" shpk	proces zbatimi	**80%**
12	Infrastruktura	Qarku Shkoder	Bashkia Malesi e Madhe	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "Preke Gjoni" Bajze	44,214,075	35,433,000	2.11.2016	**Feb-17**	FZHR	Firma "EVERES T" shpk	proces zbatimi	**85%**
13	Infrastruktura	Qarku Shkoder	Bashkia Puke	Ndertim palestre prane shkolles "Sabah Sinani" dhe "Migjeni", Puke	50,421,256	47,900,000	16.9.2016		FZHR	Firma "Arifaj"shpk	proces zbatimi	**95%**
14	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Kavaje	Ndertim i shkolles 9-vjecare "Rilindja", Lagja nr.1 Kavaje	98,859,335	64,320,000	5.10.2016	**May-17**	FZHR	Firma "Boshnjaku B" shpk	proces zbatimi	**63%**
15	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Fier	Rikonstruksion total i shkolles 9-vjeçare "Ymer Xhafa", Dermenas	22,170,855	5,343,132	18.11.2016	**Mars 2017**	FZHR	Firma "Elira&Anada" shpk	pefunduar	**100%**
16	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Divjake	Shtese anesore dhe rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare, Çerme Shkumbin, Komuna Terbuf	65,340,088	4,368,942	Tetor 2016	**Jun-17**	FZHR		pefunduar	**100%**
17	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Mallakast	Ndertim shkolla 9-vjeçare "Panahor", fshati Aranitas	58,212,749	58,212,749	22.9.2016	**Mar-17**	FZHR	Firma "Boshnjaku B" shpk	pefunduar	**100%**
18	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Librazhd	Ndertimi I shkolles 9-vjeçare fshati Gurakuq dhe fshati Rinas	10,566,046	10,566,046	24.10.2016	**Dec-16**	FZHR	Firma "Bajrami-N" shpk	perfunduar	**100%**
19	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tirane	Ndertim i shkolles 9-vjeçare "Kosova", Tirane			nuk eshte prokuruar		FZHR		nuk eshte lidhur kontrate	**0%**
20	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Gramsh	Rikonstruksion i shkollws 9-vjeçare "Asllan Shahini", Bashkia Gramsh			nuk eshte prokuruar		FZHR		nuk eshte lidhur kontrate	**0%**
21	Infrastruktura	Qarku Diber	Bashkia Diber	Ndertimi I shkolles mesme Maqellare	94,767,159	31,639,680	15.9.2016	**Sep-17**	FZHR	Firma "Alko Impeg	proces zbatimi	**60%**
22	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Fier	Rikonstruksion i shkolles "Perikli Ikonomi", Bashkia Fier	43,090,920	43,090,920	20.10.2016	**Mars 2017**	FZHR	Firma "Arkonstudio&Ed	perfunduar	**100%**
23	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Divjakë	Rikonstruksion I shkolles " Koli Allkanjari", Kemishtaj, Komuna Gradisht	65,680,320	65,680,320	20.10.2016	**Jun-17**	FZHR	Firma "I.C.C.Group" shpk	perfunduar	**100%**
24	Infrastruktura	Qarku Gjirokaster	Bashkia Tepelene	Rikonstruksion i plote i shkolles se mesme te pergjithshme "Abaz Shehu", Bashkia Tepelene	55,781,695	45,781,695	17.8.2016	**Nov-16**	FZHR	Firma "vellezerit &Caushi&"	perfunduar	**100%**
25	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Maliq	Ndertim shkolla e mesme e bashkuar Rrembec, Bashkia Maliq	54,004,290	39,605,312	2.9.2016	**Jun-17**	FZHR	Firma "Rajli Ndertim&	perfunduar	**100%**
26	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Kurbin	Rikonstruksion I shkolles mesme "At Shqefen Gjecovi" Bashkia Lac	155,384,956	78,000,000	1.9.2016	**May-17**	FZHR	Senka sh.p.k	proces zbatimi	**85%**
27	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Mirdite	Rikonstruksioni , sistem ngrohje, sistemim dhe rijetezim i terreneve sportive shkolla e mesme Rreshen, Bashkia Rreshen	118,330,066	112,443,000	26.8.2016	**Aug-17**	FZHR	Firma "Uleza ndertim " shpk	proces zbatimi	**95%**
28	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Lezhe	Rikonstruksion shkolla e mesme Gjader	17,486,179	14280000	28.12.2016	**Jun-17**	FZHR	Firma "Orniad" shpk	proces zbatimi	**82%**
29	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tiranë	Rikonstrukion I shkolles koreografike Tirane	54,230,700	21,997,060	20.10.2016	**Apr-17**	FZHR		proces zbatimi	**95%**
30	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Vlore	Rikonstruksion i shkolles se mesme "Ali Demi", Bashkia Vlore	198,761,455	147,647,000	18.11.2016	**Aug-17**	FZHR	Firma "Colombo+ Fusha"	proces zbatimi	**80%**
31	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tiranë	Ndertimi i salles se koncerteve, prane auditorit te Liceut Artistik "Jordan Misja", Tirane			nuk eshte prokuruar		FZHR	4:00 AM	nuk eshte lidhur kontrate	**0%**
32	Infrastruktura	Qarku Berat	Bashkia Berat	Rikonstruksion i shkolles se mesme Starove	52,710,346		Maj 2017	**200 dite/lidhja kontrates**	FZHR		procedure prokurimi	

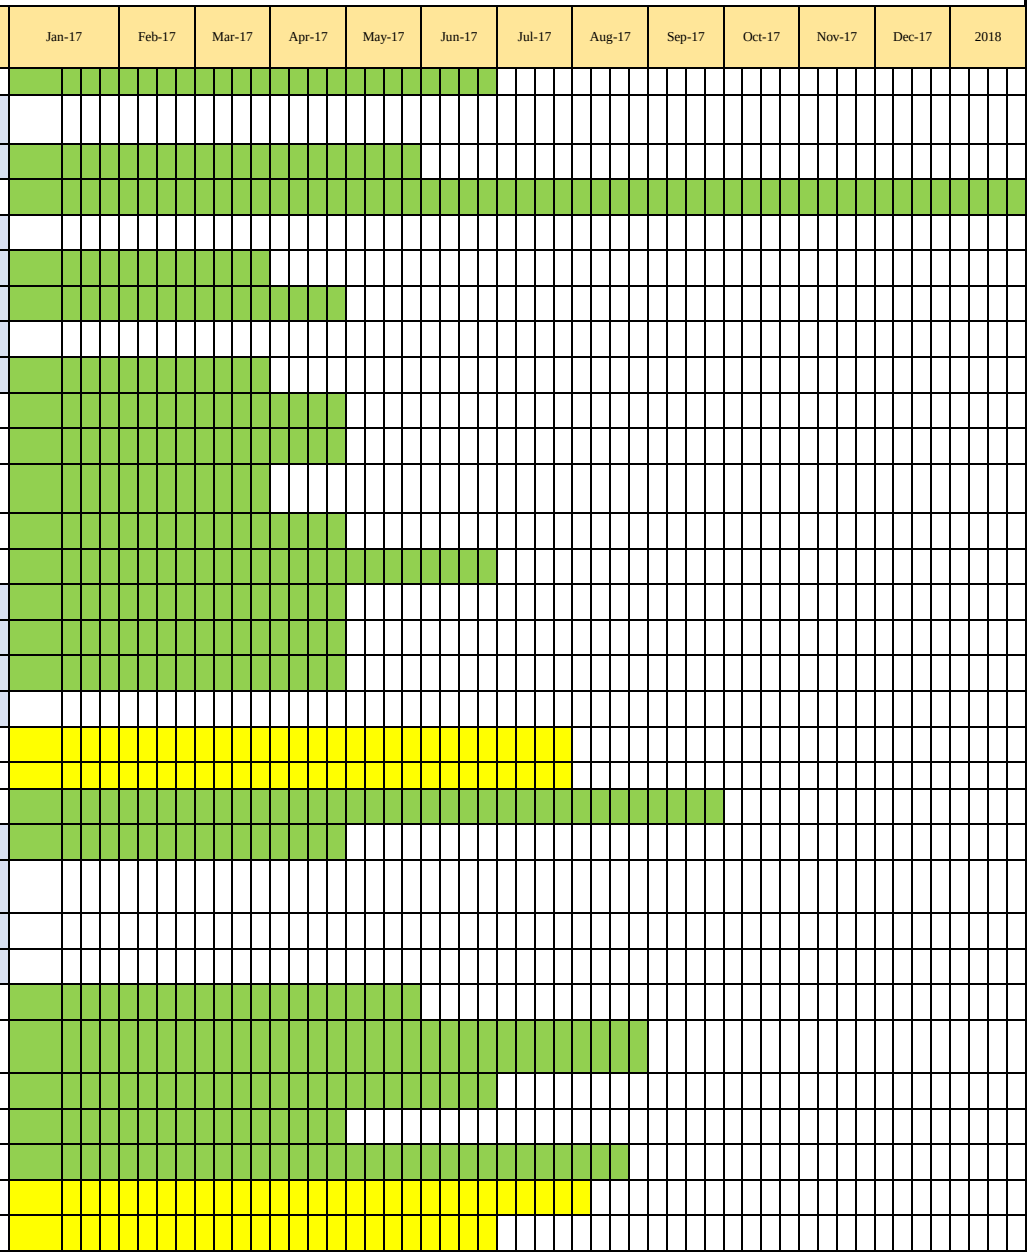

33	Infrastruktura	Qarku Berat	Bashkia Ura Vajgurore	Rikonstruksion i shkolles sw mesme te bashkuar "Refat Bani"	64,044,153		Shtator 2017	**5 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
34	Infrastruktura	Qarku Berat	Bashkia Kucove	Rikonstruksion i sheshit dhe fushave sportive tek shkollat "Gaqi Karakashi" dhe "28 Nentori"	22,311,730		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
35	Infrastruktura	Qarku Berat	Bashkia Skrapar	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Karaman Ylli", Bashkia Çorovode	63,397,640		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
36	Infrastruktura	Qarku Diber	Bashkia Mat	Rik I shkolles 9-vjecare "31 Korriku" B.Mat	74,183,197		Maj 2017		FZHR			
37	Infrastruktura	Qarku Diber	Bashkia Klos	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Ramiz Kadiu", Bejn . Bashkia Klos	61,443,512		Gusht 2017	**2 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
38	Infrastruktura	Qarku Durres	Bashkia Durres	Rikonstruksion dhe shtese anesore dhe palester e re ne shkollen "14 Nentori"	108,281,000		Gusht 2017	**2 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
39	Infrastruktura	Qarku Durres	Bashkia Kruje	Rikonstruksion i shkolles se bashkuar Borizane + palester	74,157,568		Korrik 2017	**9 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
40	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Elbasan	Rikonsteruksion I shkolles 9-vjecare, Ali Agjahu	57,413,301		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
41	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Peqin	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Gjocaj+ ndertim palester+ambjente sherbimi shkolla Gjocaj	59,641,752		Qershor 2017	**4 muaj/lidhja kontr**	FZHR	bashkim operatoresh "Boshniaku	lidhur kontrata, fillim punimesh	
42	Infrastruktura	Qarku Elbasan	Bashkia Prrenjas	Rikonstruksion i shkolles "Qybra Sokoli"	45,007,827		Gusht 2017	**4 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
43	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Fier	Rikonstruksion i shkolles artistike "Jakov Xoxa", fier	108,687,502		Gusht 2017	**182 dite/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
44	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Lushnje	Rikonstruksion I kompleksit te shkollave Fier-Shhgan (2 shkolla +Plester+terrene sportive) Bashkia Lushnje	99,154,307		Gusht 2017	**6 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
45	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Lushnje	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Krutje	63,780,171		Gusht 2017	**73 dite kalendarike/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
46	Infrastruktura	Qarku Fier	Bashkia Divjake	Rikonstruksion I shkolles Koli Sako, qyteti Divjake	47,787,439		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
47	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Korçe	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Abdulla Asabella", Vincan	30,200,000		Korrik 2017	**4 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
48	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Korçe	Rikonstruksion+shtese i shkolles 9-vjecare Lumalas	16,700,000		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
49	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Maliq	Rehabilitim i shkolles 9-vjecare Podgorie dhe rijetezimi i terreneve sportive te shkolles, Nj.Ad.Vreshtas	27,769,497		Korrik 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
50	Infrastruktura	Qarku Korce	Bashkia Kolonje	Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare "Papa Kristo Negovani" Erseke	79,962,080		Maj 2017		FZHR			
51	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Kurbin	Rikonstruksion i godines+palestres dhe ambjenteve sportive shkolla 9-vjecare "Gjin Pjetri"	99,000,002		Korrik 2017	**9 muaj/lidhja kontrates**	FZHR		procedure prokurimi	
52	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Lezhe	Rikonstruksion i shkolles mesme bashkuar Zejmen Lezhe	45,844,310		Maj 2017		FZHR			
53	Infrastruktura	Qarku Lezhe	Bashkia Mirdite	Rikonstruksion I konviktit te shkolles se mesme, Mirdite	39,752,494		Gusht 2017	**2 muaj/lidhja kontrates**	FZHR		procedure prokurimi	
54	Infrastruktura	Qarku Shkoder	Bashkia Shkoder	Rikonstruksion i pjeshem i shkolles 9-vjecare "Ura e Shtrenjte", Postribe	7,105,224		Maj 2017		FZHR		proces vleresimi ofertash	
55	Infrastruktura	Qarku Shkoder	Bashkia Puke	Rikonstruksion shkolla e mesme "Sabah Sinani"	32,308,340		Gusht 2017	**70 dite/lidhja kontrates**	FZHR		procedure prokurimi	
56	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tirane	Rikonstrukion i shkolles 9-vecare Dora Distria	97,591,282		Shtator 2017	**8 muaj/lidhja kontrates**	FZHR		procedure prokurimi	
57	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tirane	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Kosova"	265,391,003		Maj 2017	**17 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi	
58	Infrastruktura	Qarku Tirane	Bashkia Tirane	Ndertim i salles se koncerteve prane auditorit te Liceut Artistik "Jordan Misja"	117,960,244		Maj 2017		FZHR			
59	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Konispol	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Mehmet Xhaferri -kopesht	69,518,321		Korrik 2017		FZHR		procedure prokurimi	

60	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Vlore	Rikonstruksioni I shkolles se mesme "Halim Xhelo" Vlore	72,781,508		Maj 2017		FZHR																																																							
61	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Vlore	Palester sportive e mbuluar ne shkollen fillore "Ismail Qemali", Vlore	22,302,105		Gusht 2017	**3 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi																																																							
62	Infrastruktura	Qarku Vlore	Bashkia Himare	Rik.i shkolles se mesme "Spiro Gjiknuri" dhe kthimi ne nje objekt arsimor 9-vjecar, Bashkia Himare	52,600,000		Korrik 2017	**6 muaj/lidhja kontr**	FZHR		procedure prokurimi																																																							
